

# 鳥取市 令和5年台風第7号 災害復旧・復興本部会議（第2回）

**【日 時】** 令和5年10月2日（月） 13時～

**【場 所】** 鳥取市災害対策本部室（本庁舎3階）ほか各庁舎（テレビ会議）

**【出席者】** 市長、副市長、総務部長、危機管理部長、企画推進部長、  
企画推進部経営統括監、市民生活部長、環境局長、福祉部長、  
健康子ども部長、子ども家庭局長、経済観光部長、農林水産部長、  
都市整備部長、下水道部長、教育長、水道事業管理者、各総合支所長

**【次 第】** （1）災害復旧・復興予算の対応状況  
（2）分野別の取組状況、今後のスケジュール（計画）  
（3）その他

# 鳥取市 令和5年台風第7号 災害復旧・復興予算の対応状況

(8月専決補正)  
1.5億円  
応急復旧費など

(9月議会追加補正)  
69.8億円

補正額28.3億円、債務負担41.5億円

(今後計上予定)  
30億円以上

## (1)災害応急復旧関連

- ・市道や林道の応急復旧

6,900万円

## (2)避難所運営等関連

- ・避難所や災害ボランティアセンター、保健師による健康観察など

5,300万円

## (3)事業者支援関連

- ・中小事業者の復旧や操業再開の支援、利子補助、農業施設復旧や農作物防除支援など

3,100万円

市民の皆様の安全・安心な生活を守ることを第一に、一日も早い復旧・復興に向けて、全力で取り組みを進めます。

## (1)本復旧関連

- ・道路：市道佐治中央線ほか  
15億1,300万円
- ・河川：奥ノ谷川（用瀬町）ほか  
3億4,500万円
- ・公園：千代川緑地ほか  
1億8,300万円
- ・林道：林道若桜江府線ほか  
2億1,000万円
- ・農地(321か所)、農業用施設(327か所)  
4億200万円

## (2)その他

- ・通学困難生徒の支援、家屋の土砂撤去、災害見舞金、給水車による応急給水、上下水道の応急復旧、公共施設修繕など  
1億7,600万円

### 【債務負担行為】

- ・林道・河川・道路の復旧(R5～R7)  
41億4,900万円

### 【企業会計】

- ・上下水道の復旧  
1億1,600万円

## (1)本復旧関連

- ・今後新たに判明する農地、農林業施設などの災害復旧、復旧にかかる負担金の軽減、生産者への支援など

30億円



鳥取市佐治町高山橋(橋梁の崩落)

令和5年台風第7号の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定見込みについて

1. 激甚災害の指定（見込み）

令和5年台風第7号の暴風雨による災害（仮称）

2. 適用措置の指定（見込み）

【本激】 地域を限定しない

①農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置（法第5条）

農地、農道や水路などの農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。  
（過去5カ年の実績の平均では農地は85%→96%に嵩上げ）

②小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（法第24条第2項～第4項）

国庫補助の対象とならない小規模な公共土木施設等の災害復旧事業に係る地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入。

【局激】 地域を限定

【適用措置】

【対象地域】

①公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（法第3条、第4条）

公共土木施設の災害復旧事業等について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の根拠法令等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。  
（過去5カ年の実績の平均では公共土木施設等は70%→83%に嵩上げ）

鳥取県三朝町

②小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等

（法第24条第1項、第3項、第4項）

国庫補助の対象とならない小規模な公共土木施設等の災害復旧事業に係る地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入。

## 農地等の災害復旧事業等

⇒ 地域を限定しない本激

## 公共土木施設の災害復旧事業等

⇒ 鳥取県三朝町を局激

激甚災害として指定する政令の制定に向けた手続きを進める。

## 鳥取県令和5年台風第7号災害復旧・復興本部会議（第4回） 9月22日開催

・令和5年台風第7号災害についての激甚災害指定見込みについて

・対応状況、復旧・復興対策予算について 367億円（9月補正331億円+専決36億円）

※詳細は資料のとおり

# 【事務局】本部総括対応 復旧・復興の取組状況

## ■取組状況

- 本格的な災害復旧予算を、9月14日に追加提案、9月21日に可決（予算配当）
- 新たに判明した被災箇所の災害復旧関連予算の速やかな積算、追加計上
- 国会議員への要望活動、情報提供（6団体要望、鳥取県選出国会議員ほか）
- 取り組みの情報共有、進捗管理、県との連携調整

## ■復旧・復興スケジュール（計画）

項目		8月	9月	10月	11月	12月～
情報共有、進捗管理		随時管理、本部会議開催				
予算	応急対応	8/15 既決予算 8/21 専決予算				
	本復旧	積算 査定	議会 提案	9/21 追加補正	速やかな復旧・復興	
	追加措置	新たな被害の確認など予算措置が必要な場合は随時対応を検討				
応援職員、物資		必要に応じて随時対応				
県との連携		連携調整				

# 【市民生活部】被災者支援 復旧・復興の取組状況

## ■取組状況

- ・8月21日に用瀬保健センター内に災害ボランティアセンター本部を設置し、佐治地域を中心にボランティア活動を開始（住家等の土砂等の撤去など延べ32件、292名のボランティアが参加）。9月15日に災害ボランティアセンター本部をさざんか会館内に移転し、災害に係るボランティアのニーズや相談等を受け付けている。
- ・8月23日から台風7号に伴う相談窓口を開設し、9月26日時点で17件の相談対応を行った。主な相談内容は、り災・被災証明に関する事、家屋修繕に関する助成金の有無について。
- ・8月28日に安蔵、河内集落から「大雨災害に係る緊急要望書」の提出を受け、被害状況の確認を行い、担当部署への取次ぎを行った。
- ・支援物資を受け取り、被災地や被災者、災害ボランティアセンターに支援物資を送る調整を行った。

## ■復旧・復興スケジュール（計画）


項目	8月	9月	10月	11月	12月～
ボランティアセンター		災害ボランティアセンター		通常のボランティアセンター業務で対応	
相談窓口		台風第7号に伴う相談窓口		通常の相談窓口業務で対応	

# 【福祉部】被災者支援 復旧・復興の取組状況

## ■取組状況

- ・罹災住家に対し災害見舞金を支給するため、罹災住家（半壊、床上浸水以上）の実態把握に努め、早期支給を行う。9月定例会に補正予算措置済み。  
（9月末現在、住家の全壊1件、中規模半壊2件中、見舞金2件支給済み。）
- ・災害ボランティアセンター、県危機管理政策課、県福祉保健課等との連携により、被災住家に対する支援について情報共有を行い、支援制度の紹介を行った。
- ・被災者に寄り添った支援を行う、災害ケースマネジメントを運用中。

## ■復旧・復興スケジュール（計画）

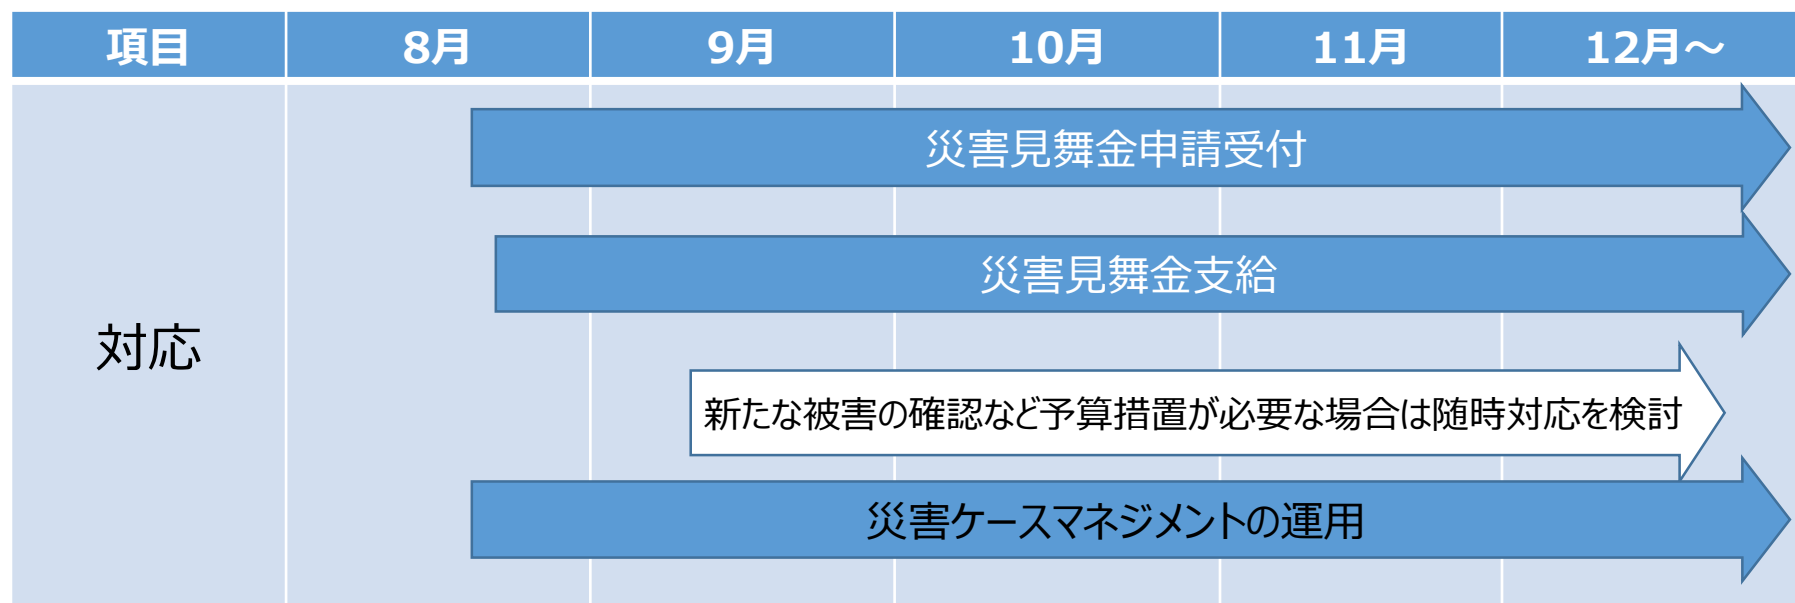

# 【環境局】被災者支援 復旧・復興の取組状況

## ■取組状況

- ・床上浸水した5件（佐治町加瀬木4件、佐治町尾際1件）の被災家屋について、佐治町市民福祉課と連携し、ボランティアの協力も得ながら、災害ごみの撤去・分別を行い処理場へ搬入。
- ・被災地域の家庭ごみ収集は、孤立地域を除き、収集経路の変更により通常収集を実施。孤立地域は、道路復旧後、直ちに通常収集を開始。

## ■復旧・復興スケジュール（計画）

項目	8月	9月～
災害ごみの撤去処分	① 8/23・24日 尾際1件対応済 ② 8/24日 加瀬木1件対応済 ③ 8/24・25・28・29・31日 加瀬木1件対応済 ④ 8/28・31日 加瀬木1件対応済 ⑤ 8/29日 加瀬木1件対応済	新たな浸水家屋等が確認され、措置が必要な場合は随時対応を検討
家庭ごみの収集	【佐治（尾際、中、栃原）】 8/17日 道路崩落のため、プラスチックごみ収集 不可 8/18日 道路仮復旧により、 <b>通常収集開始</b>  【安蔵・河内】 8/17・18日 道路崩落のため、収集 不可 8/19日 道路仮復旧により、 <b>通常収集開始</b>	

# 【都市整備部】インフラ復旧 復旧・復興の取組状況

## ■ 取組状況

被災箇所数 ○公園7公園、12箇所 ○河川36河川、67箇所 ○道路81路線、179箇所

・ 応急工事を実施し、通行不能となっていた市道佐治中央線など8箇所を復旧

※9月末時点通行止め16箇所


・ 補助災害につき9月11日より災害査定（早期確認型査定）を実施し、今後12月までに査定完了

・ 査定準備のため、現地調査、設計・積算作業等を実施中

・ 予算措置は計画的に実施

・ スポーツ広場（千代川緑地、千代川倉田緑地）の供用を令和6年7月頃見込

## ■ 復旧・復興スケジュール（計画） 河川・公園・土砂災害・道路等

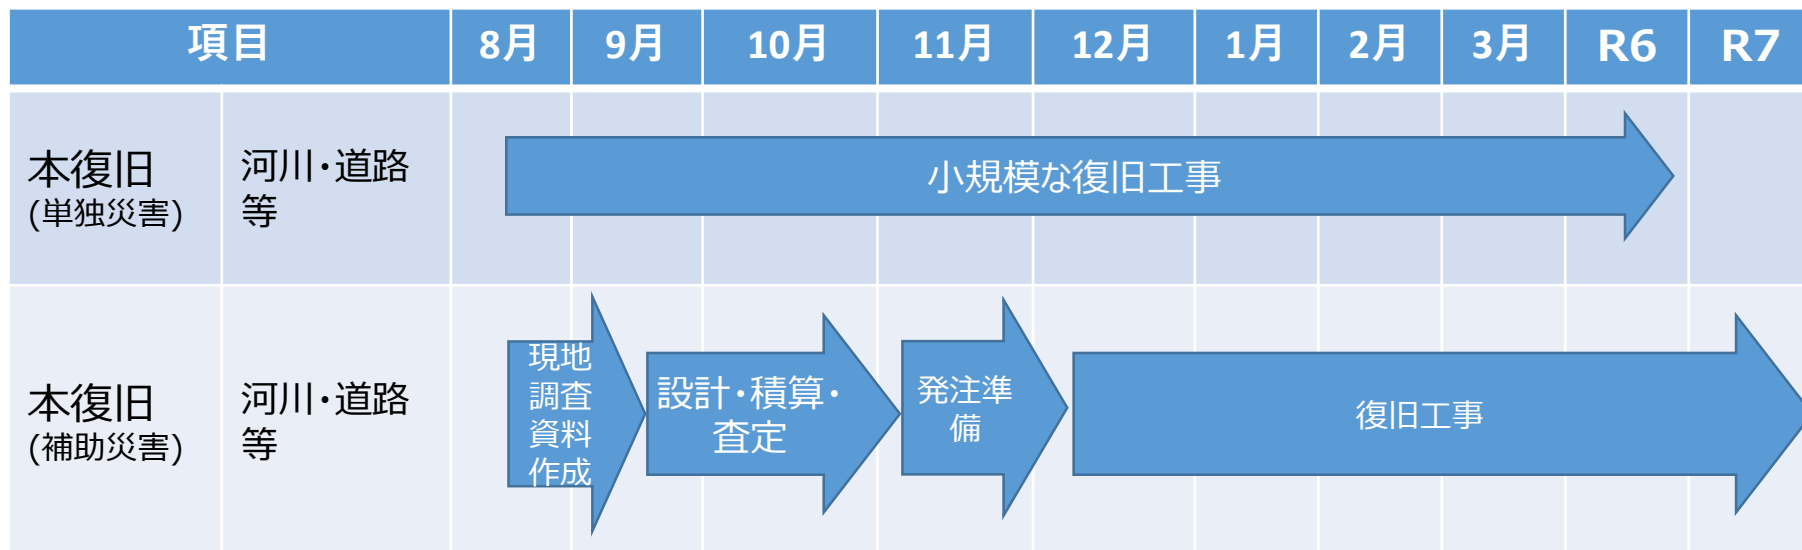

・補助災害 公園・河川等 令和5年度 7割、令和6年度 3割を目標

道路 令和5年度 5割、令和6年度 4割、令和7年度 1割を目標

※発注、着手割合



# 【水道局】インフラ復旧 復旧・復興の取組状況

## ■取組状況

- ・被災した上水道施設12箇所の応急復旧の費用（配水管仮設工事）や応急給水に要した費用（時間外手当、非常用飲料水袋ほか）について既決予算で一時的に対応し、9月定例会に補正予算を追加提案（→9/21採決）
- ・本格的な災害復旧予算は、土木施設の復旧スケジュールを踏まえ、12月定例議会への提案を想定している。

## ■復旧・復興スケジュール（計画） 上水道施設

項目	8月	9月	10月	11月	12月～
応急対応	8/15 既決予算 8/22 応急復旧完了	9/21 追加補正			
本復旧			復旧額算定（設計・積算）		災害査定及び 予算提案
追加措置			新たな被害の確認など予算措置が必要な場合は随時対応を検討		

# 【下水道部】インフラ復旧 復旧・復興の取組状況

## ■取組状況


- ・被災した9カ所の応急復旧については9月9日に完了、費用（応急復旧）は既決予算で一時的に対応し、本復旧費用の一部と併せて9月14日に追加提案、9月21日に可決
- ・本格的な災害復旧予算は、12月定例議会への提案予定で、国道・市道等の管理者と調整中。
- ・災害査定については12月予定だが、国道・市道等との調整によっては査定前着手とし、早期の復旧を目指す。

## ■復旧・復興スケジュール（計画） 下水道施設

項目	8月	9月	10月	11月	12月～
応急対応	8/15 既決予算	9/9 応急復旧完了 9/21追加補正			
本復旧	※補助災害				
追加措置					
		9/26 新たに1カ所の被災を確認（佐治町つく谷地内） 現在応急対応中（9月30日着工）			

# 【下水道部】インフラ復旧 復旧・復興の取組状況

確認された被災箇所（佐治町つく谷地内）

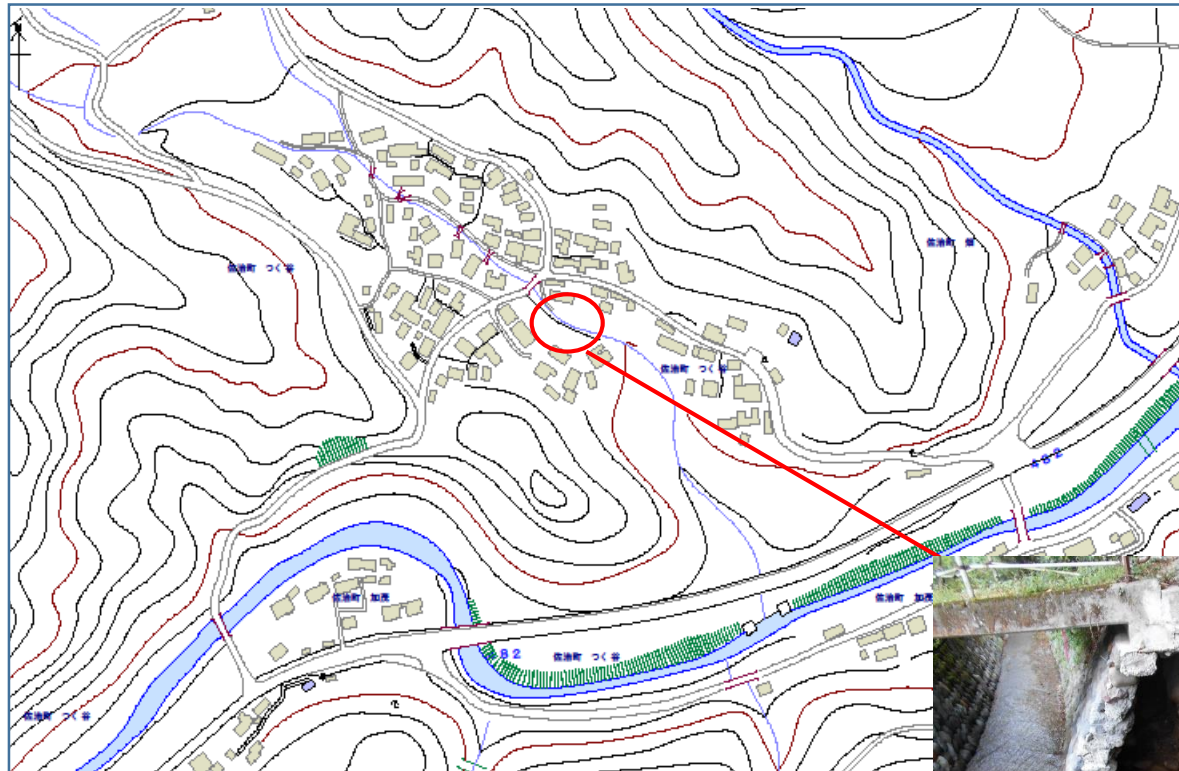

被災内容：  
汚水管φ150 L=8m

下水道管




# 【農林水産部】農林・経済再生 復旧・復興の取組状況

## ■取組状況

- ・ 8/22～25 佐治つく谷の被災果樹園へ延べ6名の職員を派遣し、援農実施
- ・ 農業用水路や農道・林道等の応急・復旧対応を実施中
- ・ (被災箇所数：農地688件、農業用施設708件、林道28路線・224か所(9/11時点))
- ・ 国、県、JA等関係機関と連携し、速やかな復旧・復興に向けた対応を実施中

## ■復旧・復興スケジュール(計画)

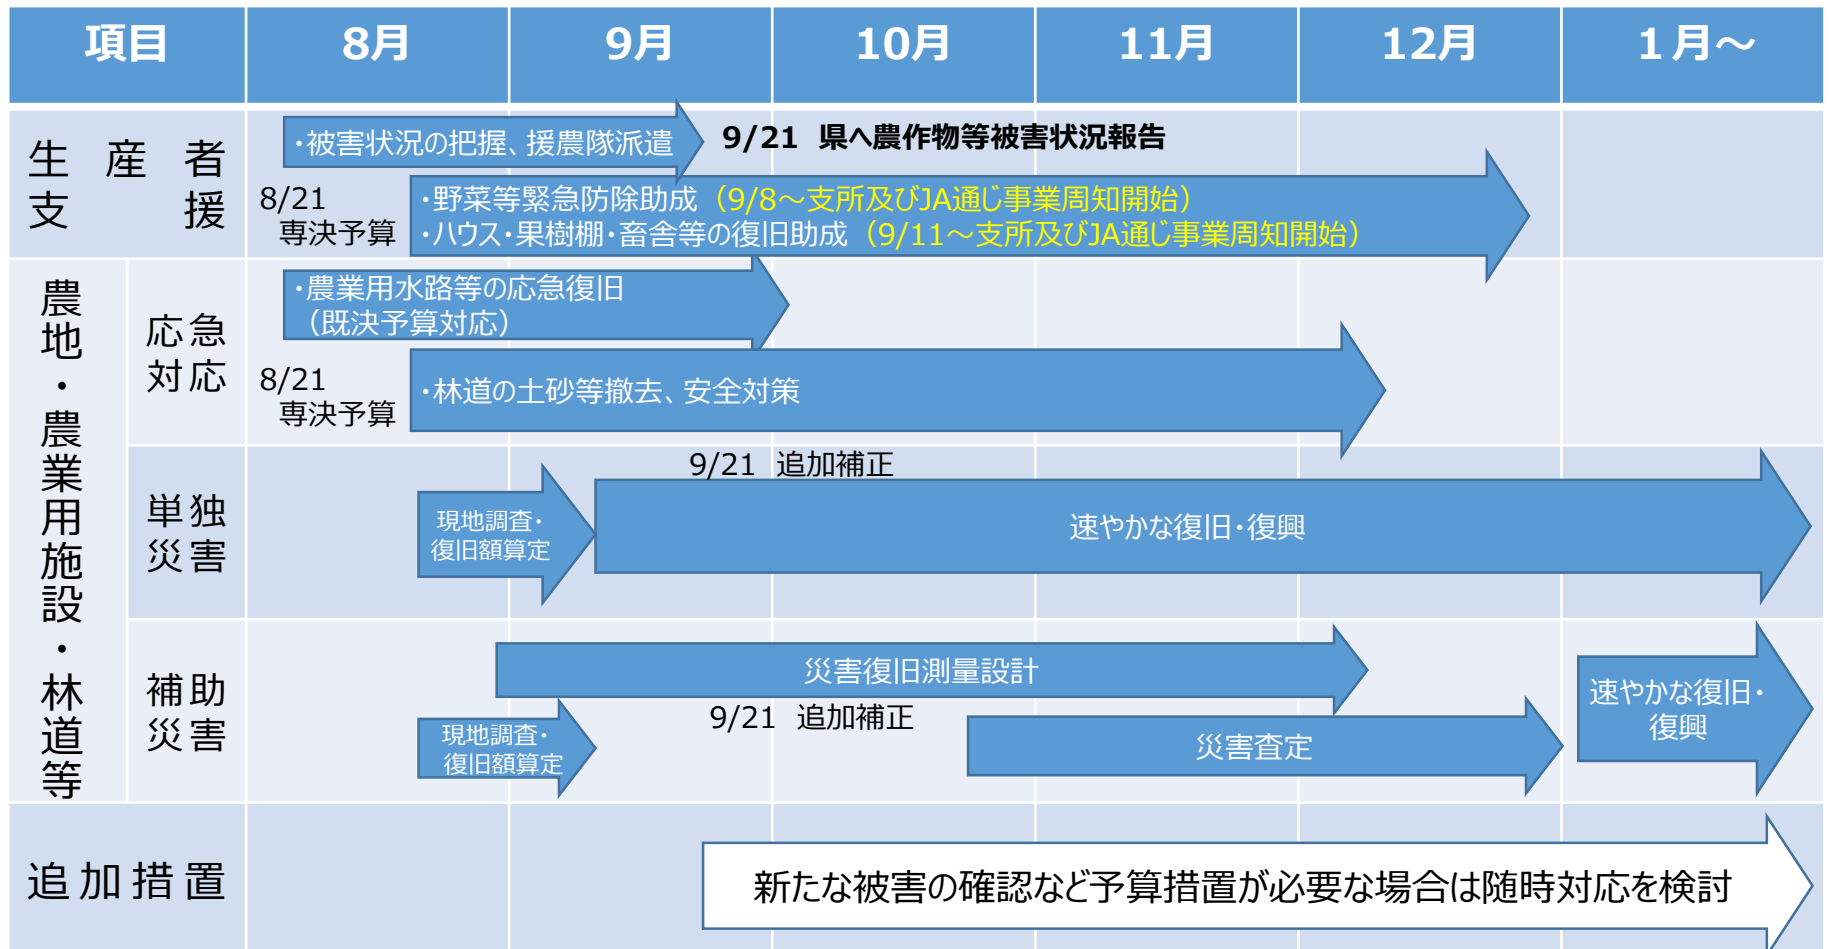

# 【経済観光部】農林・経済再生 復旧・復興の取組状況

## ■取組状況

- ・台風第7号の被害を受けた中小事業者に対し、災害等緊急対策資金を発動し、県との協調による融資・利子補助を実施。
- ・施設や設備の原状回復等に係る支援として、令和5年台風第7号被災企業復興支援補助金を施行し、受付を開始。
- ・佐治町たんぼり荘など所管施設等の災害復旧予算は、9月定例会に補正予算を追加提案  
たんぼり荘・・・10月上旬発注、年度内完了予定。  
道の駅白うさぎ・・・10月上旬発注、年内完了予定。

## ■復旧・復興スケジュール（計画）

項目	8月	9月	10月	11月	12月～
中小企業支援	8/21 専決予算 8/29 利子補助金施行	9/1 復興支援補助金施行	→ 随時受付		
施設等災害復旧		→ 議会提案	→ 災害復旧		
追加措置		→ 新たな被害の確認など予算措置が必要な場合は随時対応を検討			

# 【教育委員会】学校・保育 復旧・復興の取組状況

## ■ 取組状況

- 学校施設、文化施設等の被害状況の確認、積算、復旧予算を追加計上
- 佐治小学校の修繕を実施、9月1日より佐治小学校での通常授業（学校給食含む）を再開
- 安全な通学が困難な状況にある佐治小学校・千代南中学校児童生徒の登下校の支援策に係る予算を追加計上【災害時通学補助】

## ■ 復旧・復興スケジュール（計画）

項目		8月	9月	10月	11月	12月～
佐治小学校	応急対応	8/17～千代南中に臨時職員室を設置、オンライン授業 8/29天井修繕（既決）				
	取組状況		★9/1 授業再開	通学手段の確保及び通学支援（佐治小、千代南中）		
施設等の本復旧			積算 査定	議会 提案	修繕等復旧事業を実施 （学校施設、さじアストロパーク、美歎水源地等）	

# 【こども家庭局】学校・保育 復旧・復興の取組状況

## ■ 取組状況

### 【公立】

- ・ 被害報告を受けた4園について、3園は8月中、1園は9月初めに既決修繕予算で対応した。

### 【私立】

- ・ 被害報告を受けた3園について、いずれも9月初めまでに自園対応で修繕を行った。

## ■ 復旧・復興スケジュール（計画）

項目	8月	9月	10月	11月	12月～
応急対応	被害状況の把握				
本復旧	各園修繕				
追加措置	新たな被害報告はないため、追加不要。				

# 【鳥取市保健所】保健・医療 復旧・復興の取組状況

## ■ 取組状況

- 佐治地区担当保健師を中心に地域包括支援センター、鳥取市社会福祉協議会との情報共有を行いながら、訪問や健康相談を継続。

## ■ 復旧・復興スケジュール（計画）

項目	9月	10月	11月	12月	R5.1月～
地域見守り	地域の見守り・情報共有を実施				
	● 佐治地区の情報共有を実施 (9/5)				



# 【危機管理部】情報管理 復旧・復興の取組状況

## ■取組状況

- ・復旧・復興に関わる各部及び各総合支所の把握した被害や復旧の取組み状況を、災害情報共有システムを通して集約し、適宜、情報共有を図る。
- ・県への住宅被害報告の実施（9月末現在：全壊1棟、半壊2棟、床上浸水1棟、床下浸水45棟）
  - ※9月1日全協報告時点：全壊1棟、半壊1棟、床上浸水2棟、床下浸水26棟

## ■復旧・復興スケジュール（計画）

項目	8月	9月	10月	11月	12月～
情報管理	災害情報共有システムを通して情報集約・情報共有				

# 【企画推進部】情報管理 復旧・復興の取組状況

## ■取組状況

- ・復旧・復興に関する情報について、各部局と連携し、市民及びマスコミへ迅速に情報提供を随時実施
- ・9/20に市公式ウェブサイト、「鳥取市「令和5年台風第7号 災害復旧情報」」の特設ページを開設し、復旧状況等に応じて情報を更新

## ■復旧・復興スケジュール（計画）

項目	9月	10月	11月	12月	R5.1月～
情報管理	市民及びマスコミへの情報提供				
	● ウェブサイト開設（9/20）	ウェブサイトの掲載情報更新			

# 【佐治町総合支所】現地対策本部 復旧・復興の取組状況

## ■取組状況

- ・ 8/19から電話窓口設置。また、高齢者等の健康相談実施時に、困りごと等の聞き取りも行う。案件ごとに対応を実施。
- ・ 関係機関（県、水道局等）と情報共有を行い、管内インフラ（道路、水道等）の復旧状況を告知端末等を活用して住民周知を実施。
- ・ 農業災害対応で産業建設課の体制を強化。（支所内部兼務により2名を追加）
- ・ 総合支所の施設復旧費用を市議会9月定例会に提案。議決後に事業実施。

## ■復旧・復興スケジュール（計画）

