

超高速情報通信基盤整備事業（青谷北部追加）について

資料 1

1 事業概要

鳥取市所有のCATV施設の老朽化及び高速化対応のため、国の高度無線環境整備推進事業（令和2年度第2次補正予算繰越分）を活用して光ファイバーによる超高速通信網（通信部分）の整備を行うもの。

現在整備中のエリアに青谷地域北部を追加するもの。

2 変更後契約額

2, 155, 780 千円（工事請負費） 増額：188, 980 千円

内訳：局舎整備（サブセンター）、ケーブル敷設、電源設備、調査設計費、
附帯工事費、諸経費等

3 事業期間

令和2年度～令和3年度（令和2年度単年度事業を繰越）

4 事業状況

- 令和3年1月 「鳥取市高度無線環境整備工事」契約締結
- 4月 総務省から「高度無線環境整備事業」の追加募集が開始される
青谷地域北部追加に伴う変更を総務省に応募
- 6月 変更交付決定
定例議会予算計上
- 7月 変更契約を締結

5 青谷地域北部を選定した理由

- ① 設備の老朽化の進み具合
- ② 年度内完了が可能な事業規模

6 受注者


(株)NTTフィールドテクノ中国支店と締結した現工事を増工し実施

令和3年7月1日付で(株)NTTフィールドテクノ中国支店が吸収分割により
NTTビジネスソリューションズ(株)に変更となる

7 今後の事業スケジュール(予定)

- 令和3年7月 臨時議会に変更仮契約承認について提案
- 令和4年3月 工事完成
- 4月 サービス提供開始

別紙図面

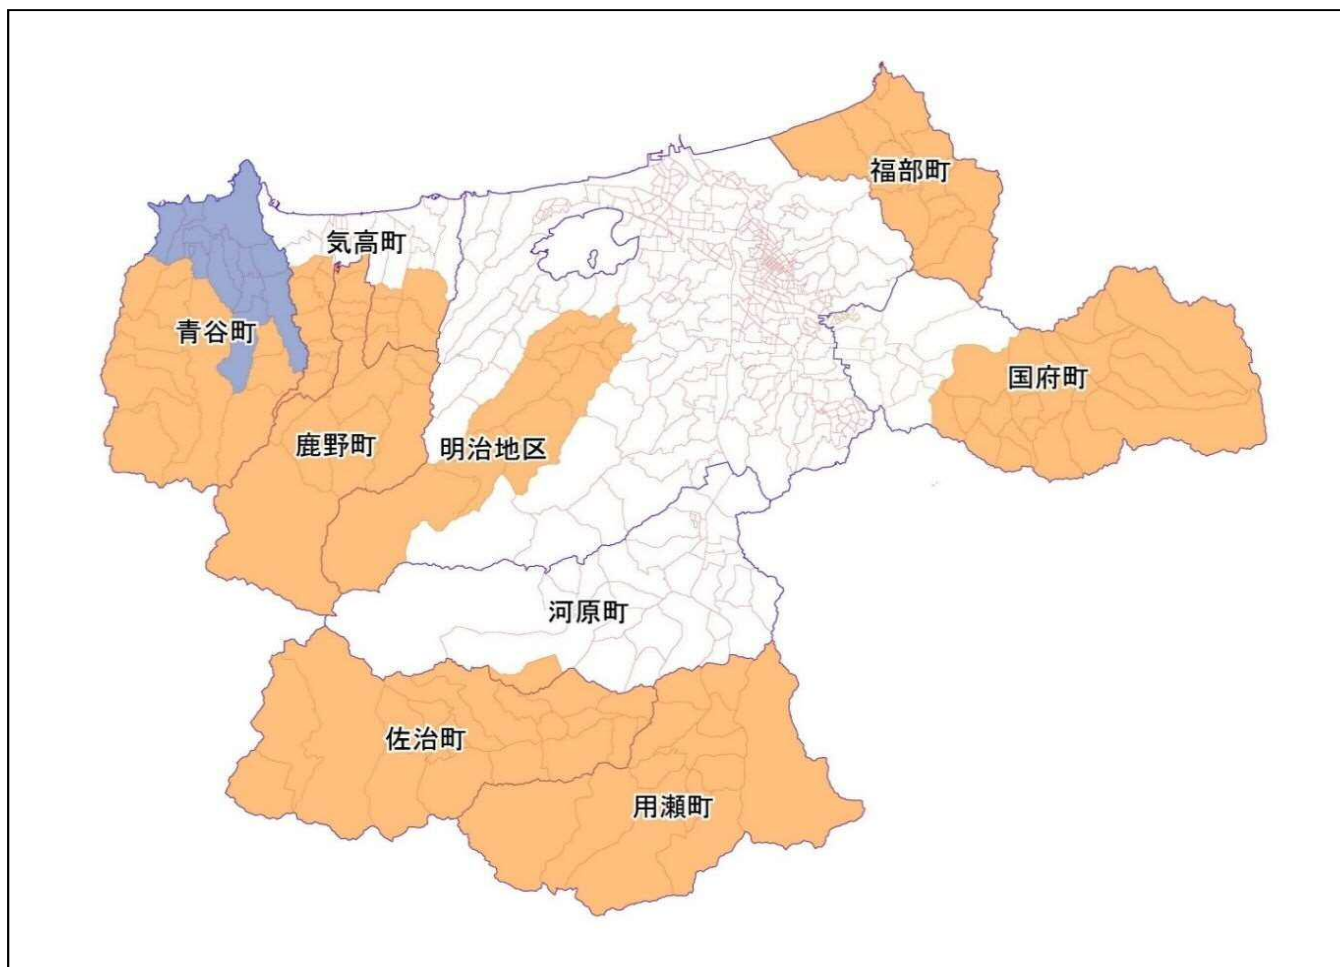


橙：当初の対象エリア

青：追加エリア

1. 工事概要（全体）

- NCN（日本海ケーブルネットワーク） / IPP（ぴよんぴよんネット）ヘッドエンド : 各1か所
- サブセンター：福部、河原、用瀬、佐治、鹿野、青谷総合支所内、国府・ふるさと就農舎内
明治地区は柱上設備
- 光ファイバー新設：約346km 青谷北部追加約35km

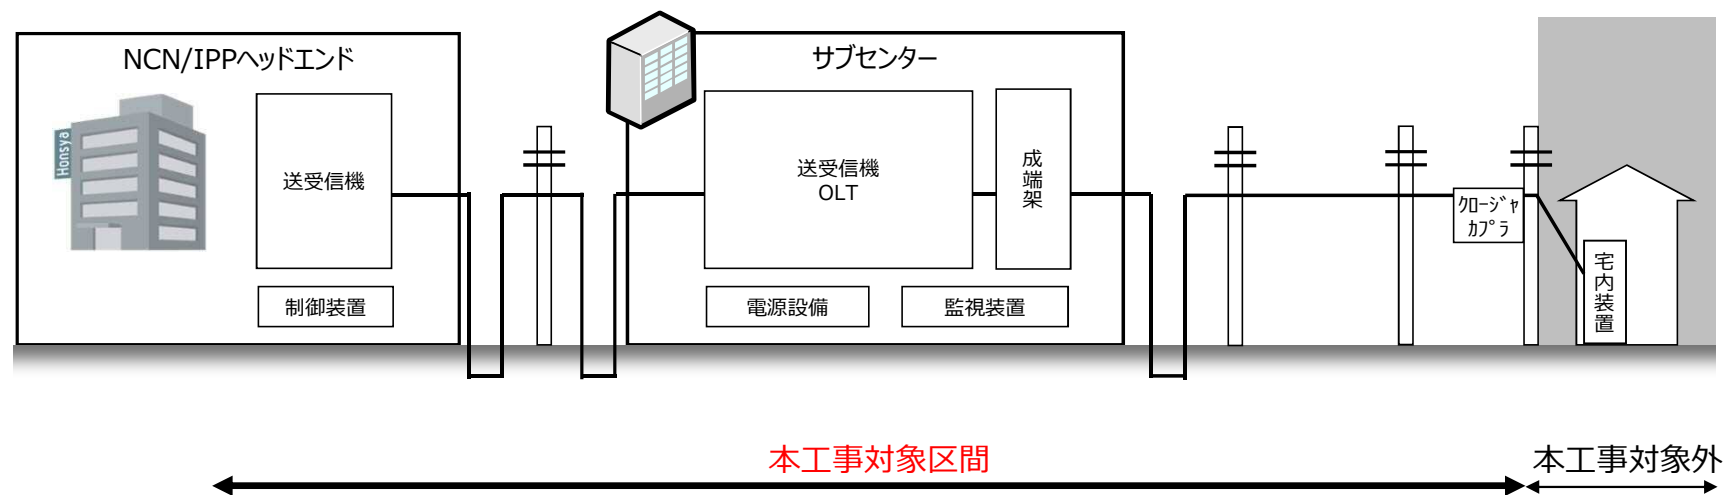

2. 工事概要（伝送路）

光ファイバー敷設工事



建柱工事



各支所内への装置取付および屋外での光ファイバー張り、電柱新設作業のため、**加入者宅での作業はありません。**またこの作業によりCATVサービスが停止することはありません。
